


HÜSAMLAR – ÇAKIRALAN BELENTEPE PROJESİ
630 MW GÜCÜNDEKİ KEMERKÖY TERMİK SANTRALİNİ BESLER

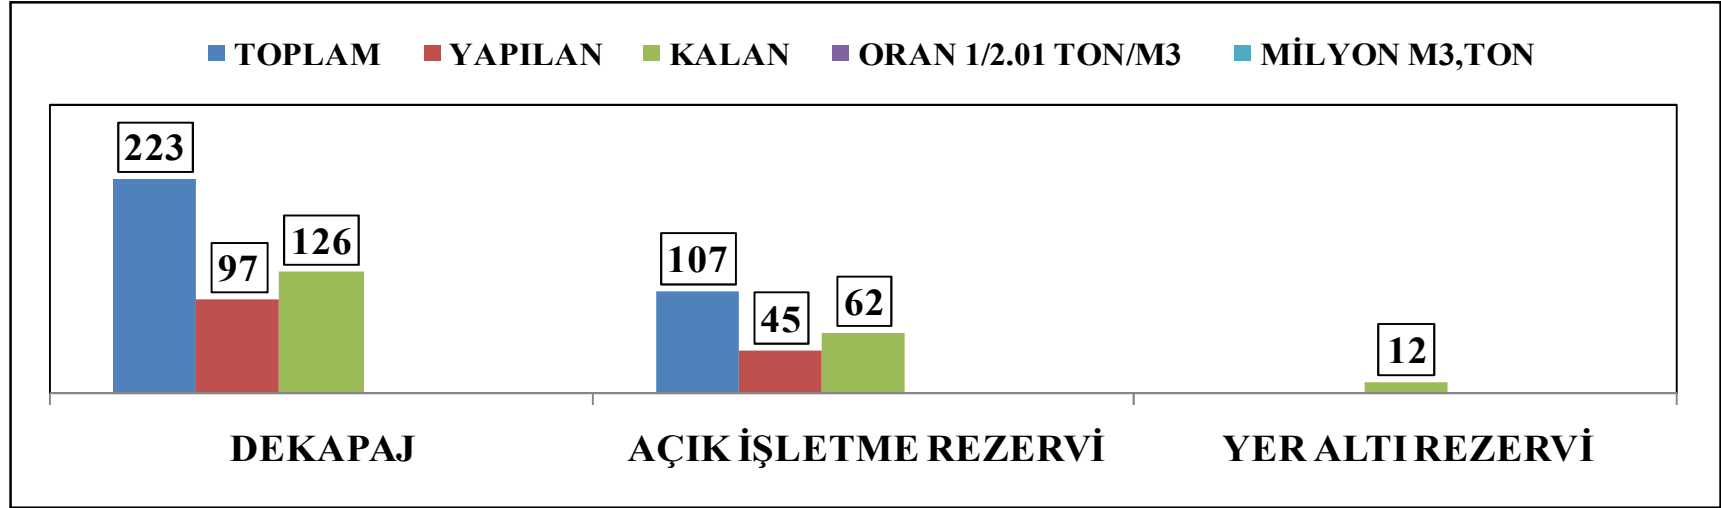

REZERV VE KALİTE

A - AÇIK İŞLETME REZERVİ: 62.690.000 TON

HÜSAMLAR AÇIK İŞLETMESİ

DEKAPAJ	108.725.000 m ³
ÜRETL REZERV	50.992.000 ton
İTFA ORANI	2.13 ton/m ³
PROJE KAPAS.	4.700.000 ton/yıl
PROJE ÖMRÜ	2011-2021 / 11 yıl
ORİJ. A.I.D (Kcal/Kg)	1.607
ORİJİNAL RUTUBET	% 30.17
ORİJİNAL KÜL	% 34.25
ORİJİNAL KÜKÜRT	% 1,20

BELENTEPE AÇIK İŞLETMESİ


DEKAPAJ	17.132.000 m ³
ÜRETL REZERV	11.071.000 ton
İTFA ORANI	1.55 ton/m ³
PROJE KAPAS.	1.000.000 ton/yıl
PROJE ÖMRÜ	2011-2021 / 11 yıl
ORİJ. A.I.D(Kcal/Kg)	1.864
ORİJİNAL RUTUBET	% 29,55
ORİJİNAL KÜL	% 31,09
ORİJİNAL KÜKÜRT	% 1,30

B – YER ALTI İŞLETME REZERVİ: 12.000.000 TON

ALATEPE SAHASI: 12.000.000 ton

C - TOPLAM REZERV (A+B): 74.690.000 TON


KEMERKÖY TERMİK SANTRALINA VERİLEN KÖMÜR MİKTARLARI

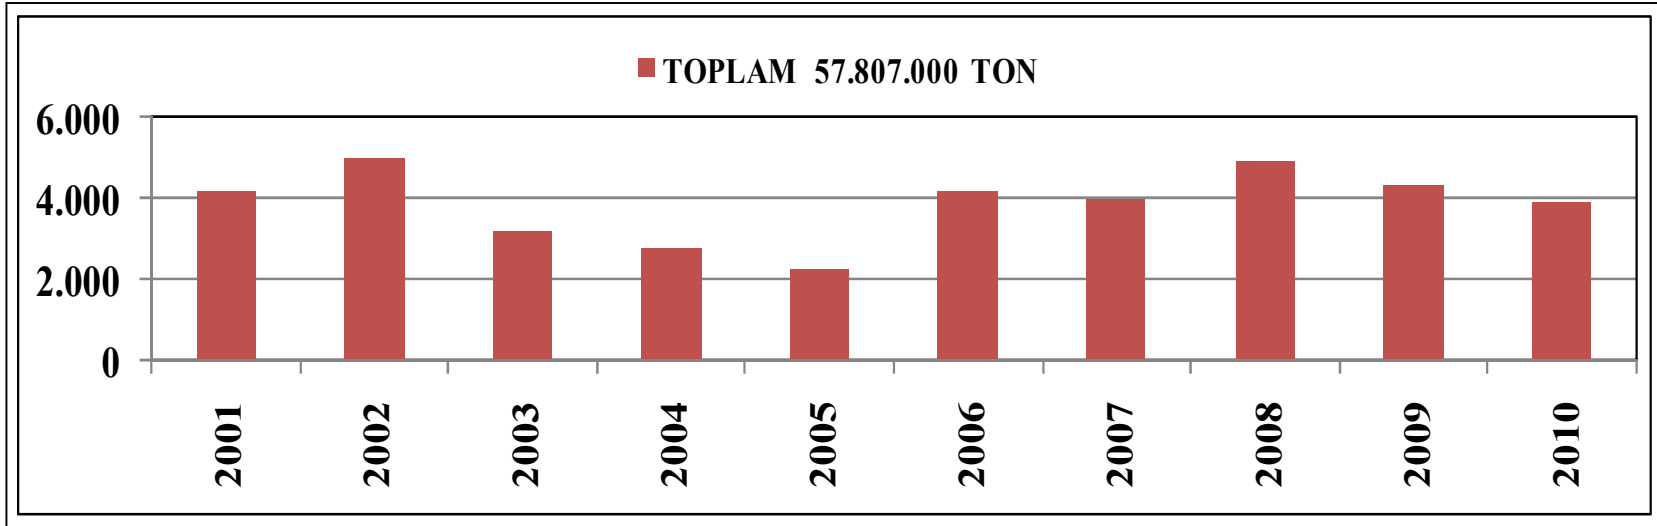

2010 YILI ÜRETİM MİKTARLARI

PROGRAM	4.650.000 ton
FİİLİ	3.899.874 ton
FARK	-750.126 ton
GERÇEKLEŞME	%84

YAPILAN DEKAPAJ MİKTARLARI

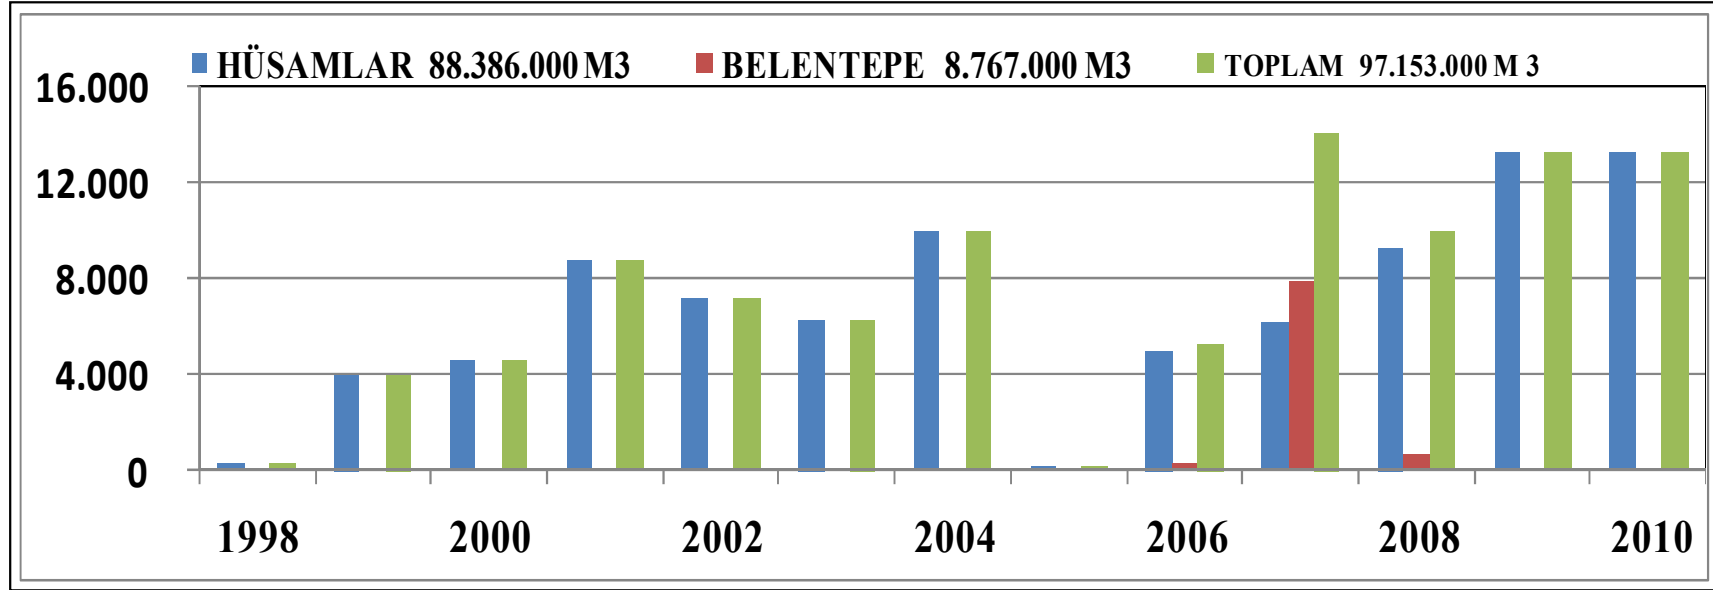

2010 YILI DEKAPAJ MİKTARLARI

PROĞRAM	12.600.000 m ³
FİİLİ	13.230.798 m ³
FARK	630.798 m ³
GERÇEKLEŞME	% 105
